ENDLOS

會勘紀錄表

客戶名稱	安口食品机械	會勘日期	2021.11.3	購買動機	照度不足，故障更換
聯絡人	尤先生	客戶預算	N		
地點	三峽	付款方式	T/T	希望照度(lux)	參考CNS規範

現場環境資訊

目前使用燈具種類 ☐ 螢光燈 ☐ 水銀燈 ☑ 複金屬燈 ☐ 無極燈 ☐ 高壓鈉燈 ☐ LED燈 ☐ 無					
燈具瓦數(w)	400	燈具數量(個)	18(室內) 11(戶外)	色溫(k)	5000～5500
現場照度(lux)	210～250	年用電時數(hr)	2112 (8/天)	電費(元/度)	3

安裝需求(無安裝需求毋需填寫)

配線需求 ☐ 需要 ☑ 不需要		迴路數量(迴)	√	繼電器數量(個)	√
燈控需求 ☐ 需要 ☑ 不需要		開關箱數量(個)	√	突波器數量(個)	√
可安裝時間 ☑ 平日 ☐ 假日		環境淨空 ☑ 可以 ☐ 不可以		希望完成時間	√
高空作業方式 ☑ 吊卡 ☐ 曲臂車 ☑ 剪刀車 ☐ 鷹架 ☐ 梯子 ☐ 天車				工資保固需求 ☑ 需要 ☐ 不需要	

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說

室內尺寸

燈具安裝位置

現場照度

高空車進場動線及入口寬度

其他事項	**提供三種報價，5年保，5年全保，10年全保，** **並提供吊卡及螃蟹車費用，舊燈客戶自行回收。**

客戶簽名 尤國煌 11/3

ENDLOS

會勘紀錄表

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說

數量11pcs

電源外置並加強防水，藏於柱後

如果有鑽洞需填補防水

客戶簽名

ENDLOS

會勘紀錄表

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說

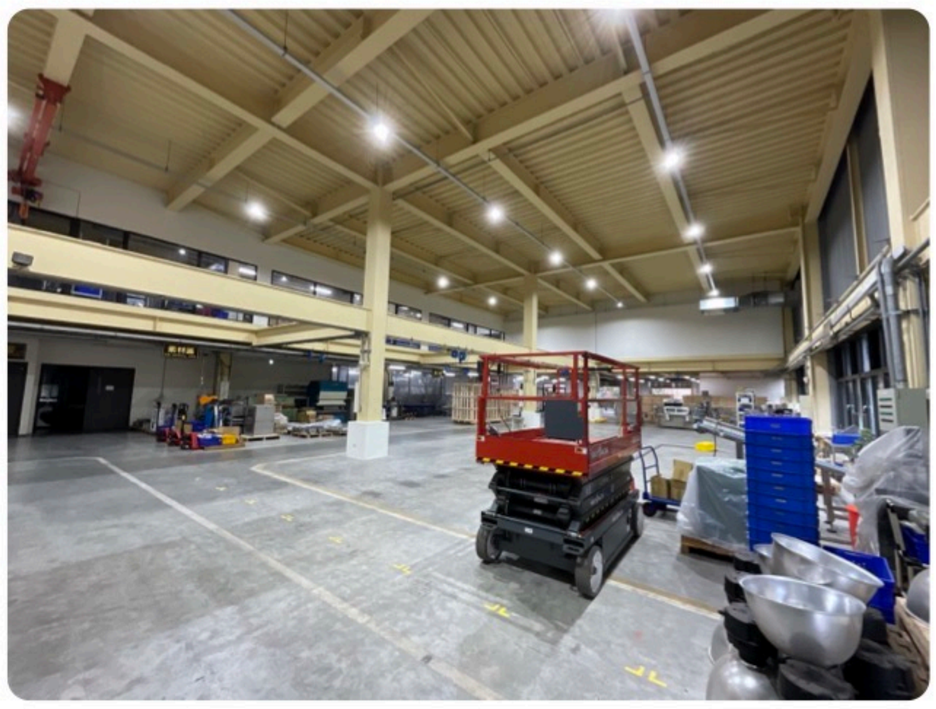

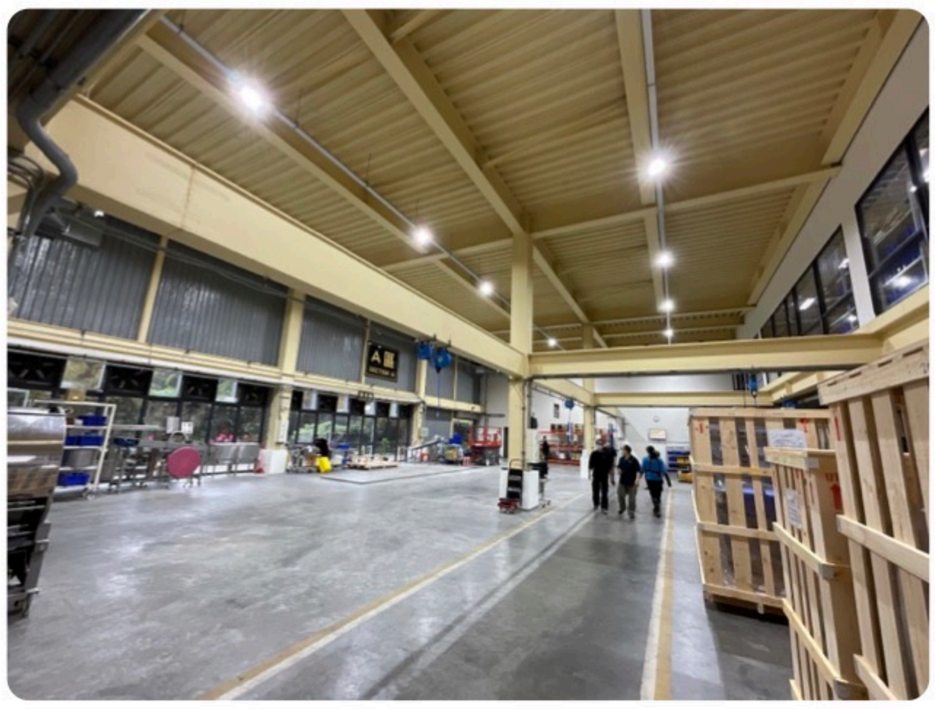

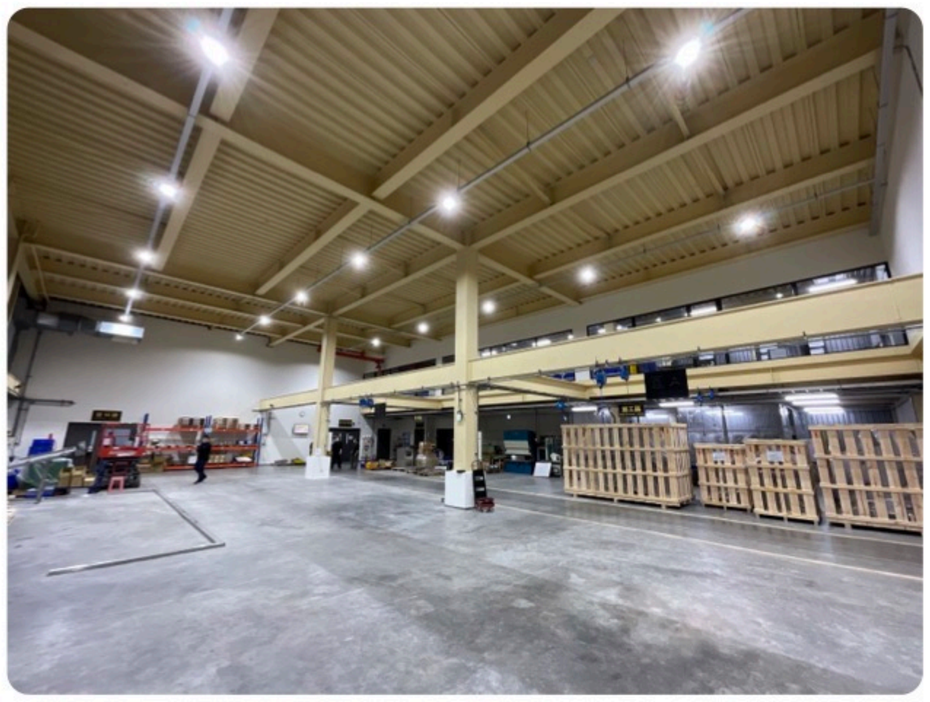

客戶簽名

ENDLOS

會勘紀錄表

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說

客戶簽名
